

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Единая CRM-система «Окна Сервис»

От заказа до прибыли проекта — без повторного ввода данных

Что получает компания

Один цифровой контур для 11 отделов: продажи, замер, касса, проектирование, закупки, склад, производство, ОТК, логистика, монтаж и финальный расчёт. Выполненная работа автоматически превращается в объём, KPI, зарплату, себестоимость и прибыль.

Подготовлено для

Компания «Окна Сервис»

Подготовлено

Pllato · Custom CRM Solutions

Дата

30 июля 2026

Демо

<https://pllato.kz/app/okna-service/>

Рабочее кликабельное демо уже реализовано по структуре ТЗ

01 · РЕШЕНИЕ

Не просто CRM, а операционная система заказа

Система построена вокруг единой Карточки проекта. Каждый отдел продолжает работу с теми же данными: адрес не перепечатывается, объём не вводится повторно, выполненная операция не создаёт второе начисление.

Главная автоматизация

Сотрудник завершает обязательный чек-лист → CRM фиксирует исполнителя и объём → создаёт начисление → закрывает этап → назначает следующего ответственного и срок → отправляет уведомление.


Сквозной процесс

Контур	Что автоматизируется	Результат
Продажи → предоплата	лид, карта, замер, расчёт, КП, договор, платёж	проект готов к исполнению
Проект → закупка	чертежи, спецификация, дефицит, поставщики, рейсы	материалы вовремя
Склад → производство	приход, резерв, комплект, выдача, задание	нет ручного двойного ввода
ОТК → монтаж	контроль, дефекты, доставка, фото, акт	качество до передачи клиенту
Объём → зарплата	расценка, KPI, подтверждения, расчётный период	зарплата и себестоимость из факта

Ролевые кабинеты

Директор видит весь бизнес и прибыль; финансовый отдел — начисления и периоды; руководитель — объём, сроки, ошибки и KPI без чужих итоговых зарплат; сотрудник — свои задачи и результаты.


Ключевые экраны уже можно проверять

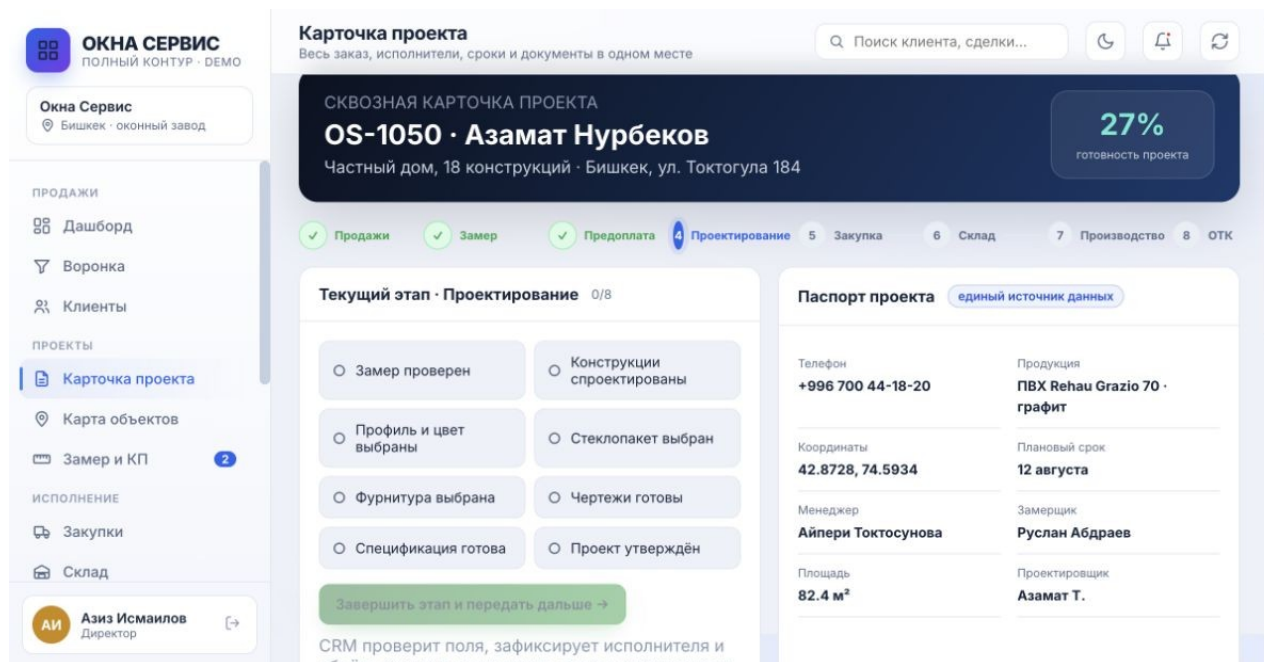


Единая карточка проекта: цепочка этапов, чек-лист, паспорт, финансы и история

В демо можно войти под десятью ролями, поставить галочки, автоматически передать проект дальше, изменить статусы транспорта, подтвердить объём, провести расчётный период и проверить ограничения доступа.

Контроль выездов и труда — в реальном времени

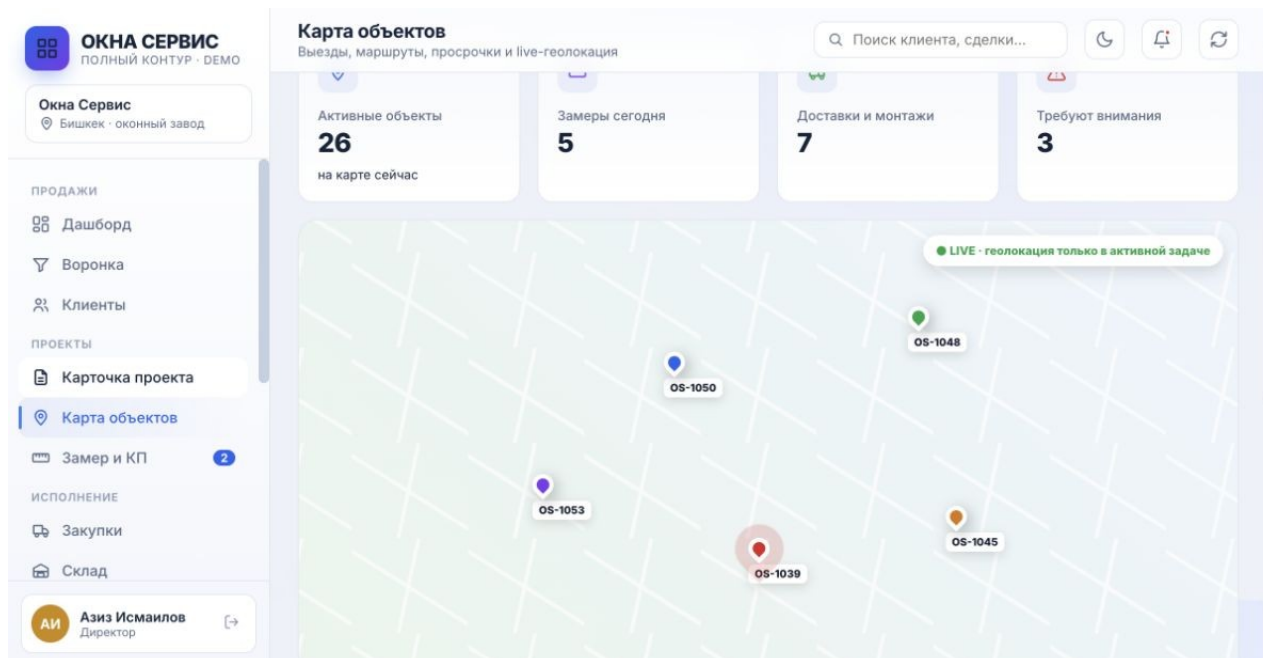

Карта директора: активные объекты, замеры, доставки, монтажи и просрочки

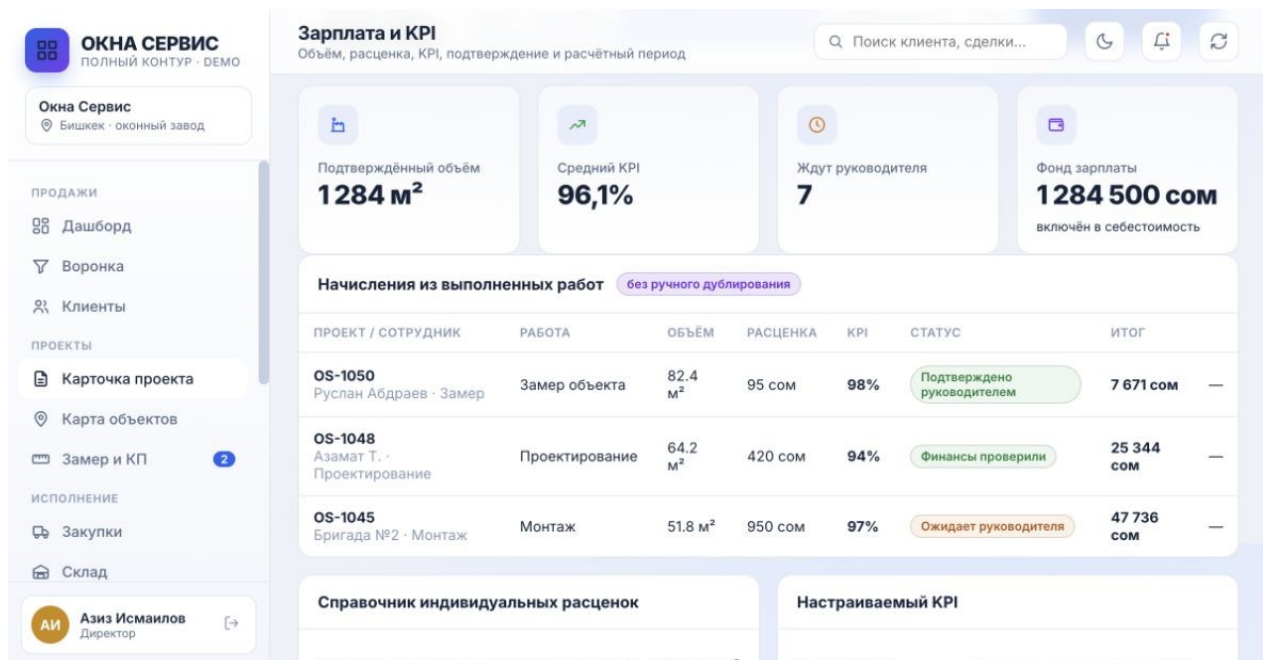

Начисления из выполненных работ: объём, индивидуальная ставка, KPI и подтверждения

04 · ПОКРЫТИЕ ТЗ

Все обязательные блоки включены в проект

Разделы ТЗ	Функциональность	Статус
1–5	Цель, единая карточка, карта и live-геолокация	Реализуется полностью
6–9	Продажи, замер, касса, проектирование	Реализуется полностью
10–15	Закупки, «Мой Склад», производство, ОТК, логистика, монтаж	Реализуется полностью
16–17	Переделки, брак и остаток оплаты	Реализуется полностью
18–25	Зарплата, расценки, KPI, периоды, себестоимость, прибыль	Реализуется полностью
26–30	Права, журнал, dashboard, автоматика, мобильная версия	Реализуется полностью
31–33	MVP, критерии приёмки и итоговый результат	Покрыто критериями сдачи

Интеграции

- 2GIS или Yandex Maps — адреса, координаты, маршруты и карта директора.
- «Мой Склад» — приход, резерв, выдача, возврат, перемещение, списание и инвентаризация.
- Файловое хранилище — фото, эскизы, чертежи, спецификации, акты и история версий.
- Уведомления — задачи, сроки, просрочки, переходы этапов и контроль оплат.

Критические правила

- Один подтверждённый объём нельзя начислить дважды.
- Старая ставка сохраняется в старом начислении после изменения справочника.
- Сотрудник не подтверждает собственную зарплату.
- Закрытый месяц не редактируется напрямую; только корректировка с причиной.
- Собственная переделка не создаёт повторную оплату автоматически.

05 · БАУ-ЭФФЕКТЫ

Дополнительно к ТЗ

Функция	Эффект для бизнеса
Умный центр управления	Подсказки директора: где проект рискует просрочиться, какой материал остановит производство и какое действие нужно сегодня.
Автопланирование закупок	Объединение дефицита нескольких проектов в один заказ и рейс с показом экономии.
Цифровой след качества	Фото «до/после», причина брака, виновный этап, срок исправления и влияние на KPI в одной цепочке.
Мобильный режим без лишних экранов	На выезде сотрудник видит маршрут, статус, чек-лист, камеру, объём, комментариев и подпись акта.
Сценарий демонстрации	Кнопка сброса данных, роли и готовые события позволяют показать полный цикл за 10–15 минут.
Drill-down показателей	Из суммы, объёма или KPI можно перейти к конкретным проектам и операциям, которые сформировали цифру.

Результат для директора

В любой момент видно: где находится заказ, кто отвечает, что просрочено, сколько подтверждённого труда создано, сколько он стоит и какую прибыль приносит проект.

06 · ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ

Поэтапный запуск без остановки работы

Этап	Срок	Результат
1. Проектирование	2 недели	интервью, роли, справочники, финальная карта процессов
2. Ядро CRM	4 недели	клиенты, проекты, карточка, стадии, чек-листы, задачи, история
3. Исполнение	5 недель	замер, проектирование, закупки, склад, производство, ОТК, логистика, монтаж
4. Зарплата и KPI	4 недели	объёмы, ставки, формулы, подтверждения, периоды, себестоимость
5. Интеграции и mobile	3 недели	карты, «Мой Склад», уведомления, камера, акты, геолокация
6. Пилот и запуск	2 недели	миграция, обучение, тестовые проекты, исправления, ввод в эксплуатацию

Организация работ

- Еженедельная демонстрация готового инкремента.
- Приёмка по сценариям из ТЗ, а не по скриншотам.
- Пилот на реальных проектах с участием каждого отдела.
- Обучение руководителей и сотрудников по ролям.
- Гарантийный период после промышленного запуска.

07 · СТОИМОСТЬ

Коммерческие условия

Пакет	Состав	Срок	Стоимость
Полный контур · рекомендовано	Все 33 раздела ТЗ, mobile, роли, зарплата/KPI, карта, интеграции, запуск	20 недель	2 480 000 сом
MVP	28 обязательных блоков без live-GPS и расширенной аналитики	14 недель	1 690 000 сом
Расширенный	Полный контур + вау-функции, расширенная аналитика и 3 мес. сопровождения	24 недели	2 980 000 сом

Предлагаемый порядок оплаты

10% — старт и проектирование; 20% — готовое ядро CRM; 25% — рабочий производственный контур; 25% — зарплата, KPI и интеграции; 20% — после пилота и приёмки.

Стоимость является предварительной оценкой по предоставленному ТЗ. После короткого обследования и фиксации интеграционных доступов состав и цена закрепляются в договоре и не меняются без согласованного расширения.

Включено

- Разработка и адаптивная мобильная версия.
- Настройка ролей, справочников, формул и чек-листов.
- Тестовая миграция исходных данных.
- Обучение ключевых пользователей.
- 30 дней гарантии после приёмки.

Не включено

Платные тарифы сторонних сервисов, оборудование, GPS-трекеры, платные API карт и отдельные доработки «Мой Склад», которые невозможно выполнить через доступный API.

Как подтвердим, что система работает правильно

Область	Контрольный сценарий
Проект	обязательные поля и чек-лист блокируют некорректный переход
Автоматика	после завершения создаются объём, начисление, задача, срок и уведомление
Зарплата	ставка подставляется по дате; дубль объёма невозможен
Права	руководитель подтверждает объём, но не видит чужую итоговую зарплату
Переделки	причина и виновник обязательны; собственная ошибка не оплачивается повторно
Период	после закрытия доступны только корректировки с обязательной причиной
Себестоимость	подтверждённая зарплата автоматически попадает в проект
Мобильность	замерщик, водитель и бригада проходят рабочий сценарий с телефона

Следующий шаг

Открыть демо, пройти сценарий OS-1050 от проектирования до следующего этапа, выбрать пакет и провести 60-минутную рабочую сессию с руководителями отделов.

Демо: <https://pllato.kz/app/okna-service/>

Plato · pllato.kz · Custom CRM Solutions
