



КОРПУС · МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

заказы от замера до акта · конструкторская воронка с чек-листами · подрядчики со сроками · склад и закупка · цех и монтаж · WhatsApp · КП, договор, ЭЦП · деньги

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ · 6 ОКТЯБРЯ 2026 · ПО ВСТРЕЧЕ 3 ОКТЯБРЯ И ВАШЕМУ ТЗ V1.0 · ВАСИЛИЙ И ЮРИЙ

Заказ проходит путь от замера до акта в одной карточке: каждый видит свой этап, подрядчики — свои сроки, собственник — всё и деньги

Василий, вы рассказали: 18 лет на рынке, 18 человек — 4 менеджера, 3 конструктора, 2 руководителя, 6 сборщиков. После договора заказ идёт к конструкторам, затем снабжение и подрядчики (малярка, металл, камень, стекло, алюминий, шпон, распил и кромка), сборка в цеху и монтаж корпуса и фасадов. Сейчас это Битрикс, МойСклад и около восемнадцати Google-таблиц, а подписки дорожают каждый год. После встречи вы прислали функциональное ТЗ на 21 раздел — мы переработали демо под него: 33 экрана, 9 ролей, каждый раздел ТЗ показан на своём экране. Цена — одна и фиксированная.

СТОИМОСТЬ

2 200 000 ₸

ЯДРО

2–3 недели

ПОЛНОСТЬЮ

4–8 недель

ОПЛАТА

10 · 45 · 45 %

Что вы получаете

ЗАКАЗ

Ваши этапы и чек-листы

Воронка продаж и проектов по вашему ТЗ — 16 этапов со шкалой готовности. Менеджер и конструктор идут по чек-листу своего этапа — пока не отмечено всё, карточка не двигается. Конструкторская воронка с модерацией менеджером и пакетом запуска из 8 документов.

ПРОИЗВОДСТВО

Подрядчики, склад, монтаж

Конструктор отметил подрядчиков — карточка размножилась на их доски со сроками и документами, цена и сальдо зафиксированы. Снабжение: в наличии или на заказ, плановая дата поставки обязательна. Загрузка бригад и конструкторов, отпуска, рейсы водителя.

ДЕНЬГИ

Вместо восемнадцати таблиц

Расчёт по вашей таблице с прайсами поставщиков, КП и договор из карточки, ЭЦП. Долги клиентов и подрядчикам, приходы и административные расходы, зарплаты, аналитика. Без абонентской платы.

«Нам важно, что помимо продаж и договоров у нас были отдельные доски для контроля производства, для склада, для синхронизации заказов со складом и для подрядчиков — видеть сроки исполнения». Это и есть каркас демо.

СТАРТ · 10 %

220 000 ₸

ПОСЛЕ ЯДРА · 45 %

990 000 ₸

ПОСЛЕ ШЛИФОВКИ · 45 %

990 000 ₸

ПОДАРОК · = 300 000 ₸

калькулятор

Ваши слова на встрече → что сделано в демо

ВСТРЕЧА 03.10 · 18 ЧЕЛОВЕК · 9 ПОДРЯДЧИКОВ · БИТРИКС + МОЙСКЛАД + ~18 GOOGLE-ТАБЛИЦ

ВЫ СКАЗАЛИ	ЧТО СДЕЛАНО В ДЕМО	РАЗДЕЛ
«Карточка заказа должна двигаться по этапам... этапы разграничены: продажа, конструкторы, снабжение, подрядные работы, сборка, монтаж»	Воронка с 12 вашими этапами, шкала готовности на каждой карточке	Продажи
«Первичный замер, первичная отрисовка, финальное согласование, контрольный замер, контрольная отрисовка, дополнительное согласование, запуск»	Этапы именно в этом порядке; изменения после договора — отдельное согласование в конструкторской воронке	Продажи
«Пока он весь чек-лист не прочекал — карточка не может двинуться дальше» · «кухня — свои действия, шкаф — свои»	Чек-листы менеджера и конструктора; шаблоны под тип изделия; переход заблокирован, система пишет почему	Конструкторы
«Конструктор указывает, кто из подрядчиков участвует, — и на каждом появляется на его доске карточка», с дедлайном	Карточка размножается на доски подрядчиков с документами и сроком; просрочка видна начальнику производства	Подрядчики
«Сколько какому подрядчику должны, сколько оплатили, какое сальдо»	Цена фиксируется при передаче, оплаты вычитаются, сальдо по каждому	Деньги
«Чтобы подрядчики заходили под своим аккаунтом, скачивали документацию... как в облаке, и напоминало о дедлайне»	Кабинет подрядчика: свои заказы, файлы, срок, «взял в работу» и «готово»	Подрядчики
«Малярку контролировали отдельной табличкой — сейчас её надо внедрить»	Свой участок — как подрядчик: та же доска и тот же контроль	Подрядчики
«ТМЦ: листовые, кромочные материалы, фурнитура — очень обширная» · «склад около 60 м ² , номера хранения»	Склад с ячейками, резерв под заказы, минимальные остатки	Склад
«Конструктор формирует заявку на склад в карточке... закупщик отгружает со склада либо дозаказывает»	Заявки из карточки: что есть, что дозаказать и у какого поставщика	Склад
«Около пятидесяти пунктов... петли в двадцати вариантах... подтягивается из прайсов поставщиков по артикулу»	Расчёт по образцу вашей таблицы; прайсы поставщиков обновляются по артикулу	Расчёт
«КП, договор — всё в одной системе» · «хотелось бы подписывать в электронном виде»	КП из расчёта, договор из карточки, ЭЦП по ссылке или скан бумаги	Продажи
«Переписываются в WhatsApp с клиентом — было бы удобно контролировать»	WhatsApp в карточке заказа, авто-сообщения клиенту при смене этапа	Продажи
«Календарь отпусков, загрузки производства, каждой бригады, каждого конструктора»	Календарь загрузки на месяц с отпусками и свободными окнами	Конструкторы
«Водителю падала заявка — свой график вывозов» · материалы от подрядчиков и готовое — клиенту	Рейсы водителя (даже стороннего), доставка, монтаж корпуса и фасадов	Производство
«У сборщика — только свой заказ, кладовщик — только склад... что-то смотреть, что-то менять»	8 ролей, вход по своему логину, права «смотреть» и «менять»	Система
«Восемнадцать Google-таблиц: долги клиентов, подрядчики, расчётник, зарплаты, приходы, расходы» · аренда, чай, кофе, уборка	Долги, расчёты с подрядчиками, приходы и административные расходы, зарплаты, аналитика	Деньги

21 раздел Т3 → где каждый в демо

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ Т3 «CRM ДЛЯ МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» · ВСЕ РАЗДЕЛЫ ВХОДЯТ В 2 200 000 Т

Корпус · мебель на заказ
Коммерческое предложение

РАЗДЕЛ	ЧТО В Т3	ЭКРАН ДЕМО
1–3	Одна карточка проекта, дочерние карточки, обязательные поля этапа, причина возврата	Карточка заказа: блок перехода, изделия, история
4	Воронка продаж: новая заявка → сбор информации → первичная отрисовка → корректировка → согласование → договор	Воронка заказов
4.1	Классифицированные причины отказа, комментариев — дополнительно	Причины отказа + обязательное окно при отказе
5	Чек-лист менеджера 15 пунктов, Т3 строителям по коммуникациям	Карточка: чек-лист, блок «Т3 по коммуникациям»
6	Воронка конструктора, модерация менеджером, пакет запуска из 8 документов	Конструкторская воронка, модерация, пакет запуска
7	Дробление на цех и подрядчиков, календарь начальника производства	Подрядчики, календарь дедлайнов
8	Снабжение: в наличии / на заказ, плановая и фактическая дата поставки	Снабжение
9–10	Карточка сборщика, доставка и установка	Мои заказы · бригада, доставка и монтаж
11	Оплата и закрытие: договор, оплачено, остаток, статус, документы	Оплата и закрытие
12–13	Роли, зоны ответственности, матрица видимости	Роли и права · 9 ролей
14–15	14 автоматизаций, уведомления за 2 дня, за день, при просрочке	Автоматизации
16–17	Связи сущностей, история изменений	Изделия и история в карточке
18	Приоритет MVP P0	Ядро — 2–3 недели
19–20	8 отчётов руководителя: почему заказ стоит и кто отвечает	Отчёты руководителя
21	Вопросы до разработки	Наши ответы — экран «Вопросы»

Соответствие вашему Т3

Функциональное Т3 «CRM для мебельного производства» v1.0 по разделам → где это в демо. Клик — открыть экран. Все разделы P0 из раздела 18 — в ядре.

РАЗДЕЛ	ЧТО В Т3	ГДЕ В ДЕМО	СТАТУС
1	Принцип: одна карточка проекта, дочерние карточки	Карточка заказа	входит
2	Единая модель карточки	Карточка заказа	входит
3	Универсальная логика этапа: обязательные поля, причина возврата	Блок перехода	входит
4	Воронка отдела продаж — 6 этапов	Воронка	входит
4.1	Причины потери заявки	Причины отказа	входит
5	Работа менеджера: чек-лист 15 пунктов, Т3 по коммуникациям	Карточка заказа	входит
6	Воронка конструктора, модерация, пакет запуска	Конструкторская воронка	входит

Соответствие Т3 — отдельный экран в демо: клик по разделу открывает нужный экран.

Пульт: все заказы с готовностью, что горит у подрядчиков и на складе, деньги месяца

Корпус · мебель на заказ
Коммерческое предложение

ЗАКАЗЫ В РАБОТЕ · ДОЛГИ КЛИЕНТОВ · ДОЛГ ПОДРЯДЧИКАМ · ГОРИТ · ВОРОНКА

КОРПУС
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

СОБСТВЕННИК

Пульт

Приходы и расходы

Долги клиентов и подрядчикам

Зарплаты

Аналитика

Отчёты руководителя

ПРОДАЖИ

Воронка заказов

Карточка заказа

Клиенты

Расчёт заказа

КП, договор, ЭЦП

WhatsApp

Причины отказа

Оплата и закрытие

КОНСТРУКТОРЫ

Конструкторская воронка

Чек-листы этапов

Загрузка и отпуски

ПРОИЗВОДСТВО

Цех и бригады

Подрядчики

Кабинет подрядчина

Календарь дедалайнов

Доставка и монтаж

Мои заказы · бригада

Мои рейсы · водитель

СКЛАД

Пульт

Пульт · 05.10, пн

Все заказы — на каком этапе и насколько готовы, что горит у подрядчиков и на складе, деньги месяца. Вместо восемнадцати Google-таблиц — одна система.

заказов в работе

16

на 32,71 млн

у подрядчиков

6

1 просрочено

клиенты должны

11,31 млн

остатки по договорам

мы должны подрядчикам

1,08 млн

за принятые и в работе

октябрь: пришло / ушло

2,05 млн / 2,79 млн

с 1 октября

Заказы и готовность

ЗАКАЗ	КЛИЕНТ	ЭТАП	ГОТОВНОСТЬ	МОНТАЖ	СУММА
K-1493 Кухня	Нурлан Сарсенов	Оплата	97 %	26.09	2 100 000
K-1505 Шкаф / гардероб	Ербол Нурланов	Качество и АВР	94 %	05.10	1 280 000
K-1510 Шкаф / гардероб	Камила Есенова	Готово к вывозу	80 %	08.10	960 000
K-1502 Кухня	Алексей Пак	Сборка	70 %	09.10	1 650 000
K-1501 Кухня	Жанар Сейтова	Производство и подрядчики	60 %	16.10	3 480 000
K-1503 Шкаф / гардероб	Динара Ахметова	Производство и подрядчики	60 %	10.10	890 000
K-1509 Другое изделие	ТОО «Офис-Плюс»	Запуск в производство	42 %	23.10	2 300 000
K-1504 Другое изделие	ТОО «Кофейня Арома»	Модерация менеджером	34 %	—	4 200 000
K-1506 Кухня	Мария Ким	Замер и техпроект	26 %	—	4 950 000
K-1513 Шкаф / гардероб	Гульнара Тлеуова	Замер и техпроект	26 %	—	640 000
K-1514 Кухня	Роман Ковалёв	Замер и техпроект	26 %	—	3 150 000
K-1507 Другое изделие	Асет Байжанов	Договор	18 %	—	1 120 000
K-1516 Кухня	Айнур Омарова	Согласование	15 %	—	1 840 000

Горит · 5

- «Стекло-Мастер» просрочил 3 дн. · K-1503
Зеркало серебро 4 мм · 2 полотна 2350×780 · срок был 02.10, монтаж у клиента 10.10
- Не хватает на складе: ЛДСП Egger W980 платиново-белый
есть 6 лист, в резерве под заказы 9 — дооказывать 3
- Не хватает на складе: Ящик Blum Legrabox M 500 мм антрацит
есть 4 компл, в резерве под заказы 6 — дооказывать 2
- K-1507: чек-лист менеджера не закрыт
Максат - 4 пункта — карточка не уйдёт конструктору
- K-1510 готов и ждёт монтажа на складе
Камила Есенова · монтаж 08.10 · менеджеру ушло уведомление

Пульт. 13 заказов в работе на 27,8 млн ₸ — у каждого этап, шкала готовности и дата монтажа. Справа «горит»: «Стекло-Мастер» просрочил зеркала на 3 дня, на складе не хватает ЛДСП W980 и ящиков Legrabox под заказы, чек-лист менеджера не закрыт, готовый заказ ждёт монтажа, клиент не доплатил остаток.

Навигация — одна колонка

Слева разделы: собственник, продажи, конструкторы, производство, склад. Каждая роль видит только свои пункты.

«Около восемнадцати Google-таблиц, которые разнo отвечают за свои действия». Здесь всё собирается из карточек — без копирования.

Pllato · студия разработки · pllato.kz

04

16 этапов по вашему ТЗ — и карточка, в которой собрано всё по проекту

Корпус · мебель на заказ
Коммерческое предложение

ЗАЯВКА → СБОР ИНФОРМАЦИИ → ОТРИСОВКА → КОРРЕКТИРОВКА → СОГЛАСОВАНИЕ → ДОГОВОР → ЗАМЕР И ТЕХПРОЕКТ → МОДЕРАЦИЯ → ЗАПУСК → ПРОИЗВОДСТВО → СБОРКА → ВЫВОЗ → МОНТАЖ → КАЧЕСТВО И АВР → ОПЛАТА → ЗАКРЫТ

КОРПУС
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

Собственный
Пульт
Приходы и расходы
Долги клиентов и подрядчикам
Зарплаты
Аналитика
Отчёты руководителя
ПРОДАЖИ
Воронка заказов
Карточка заказа
Клиенты
Расчёт заказа
КП, договор, ЭЦП

Воронка заказов

заказ, клиент, артикул, ячейка

ЗАЯВКА

Собственный

Воронка заказов

Этапы по вашему ТЗ: новая заявка → сбор информации → первичная отрисовка → корректировка → согласование → договор → замер и техпроект → модерация менеджером → запуск → производство и подрядчики → сборка → готово к вывозу → доставка и монтаж → качество и АВР → оплата → закрыт. Одна карточка проекта на весь путь, шкала готовности на каждой.

Новая заявка	Сбор информации	Первичная отрисовка	Корректировка	Согласование	Договор	Замер и техпроект
К-1512Шкаф / гардероб Светлана Волкова Гардероб распашной 2 м Ольга 2 % 0,72 млн	К-1511 Тимур Абилов Кухня 2,6 м Максат 5 % 1,39 млн	К-1508 Ольга Ли Кухня 3 м - ЛДСП + стекло Ольга 9 % 1,78 млн	К-1515Шкаф / гардероб Руслан Ибраев Шкаф-купе 5 м - фасады зеркало + ЛДСП Дина 12 % 0,98 млн	К-1516 Айнура Омарова Кухня угловая 2,9 м - фасады МДФ плёнка Айгерим 15 % 1,84 млн	К-1507Другое изделие Асет Байжанов Детская: шкаф, стол, кровать-чердак Максат 18 % 1,12 млн	К-1506 Мария Ким Кухня П-образная - фасады шпон - встроенная техника Дина - Тимур 26 % 4,95 млн
						К-1513Шкаф / гардероб Гульнара Тлеуова Шкаф в прихожую 1,8 м Айгерим - Артём 26 % 0,64 млн
						К-1514

Воронка заказов. Колонка — этап, на карточке клиент, изделие, менеджер и конструктор, сумма и шкала готовности. Красная карточка — подрядчик по заказу просрочил.

КОРПУС
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

Собственный
Пульт
Приходы и расходы
Долги клиентов и подрядчикам
Зарплаты
Аналитика
Отчёты руководителя
ПРОДАЖИ
Воронка заказов
Карточка заказа
Клиенты
Расчёт заказа
КП, договор, ЭЦП
WhatsApp
Причины отказа
Оплата и закрытие
КОНСТРУКТОРЫ
Конструкторская воронка
Чек-листы этапов

Карточка заказа

заказ, клиент, артикул, ячейка

ЗАЯВКА

Собственный

Воронка / К-1504

→ Запуск в производство

К-1504 · Барная стойка и витрины · шпон дуба · металлокаркас

ООО «Кофейня Арома» · пр. Достык, 89 · менеджер Ольга · конструктор Тимур

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Новая заявка	Сбор информации	Первичная отрисовка	Корректировка	Согласование	Договор	Замер и техпроект	Модерация менеджером	Запуск в производство	Производство и подрядчики	Сборка	Готово к вывозу
13	14	15	16								
Доставка и монтаж	Качество и АВР	Оплата	Закрыт								

34 % готовность заказа

Дальше не двигается: запуск запрещён: менеджер не подтвердил финальный технический проект
Так задумано: пока ответственный не прошёл свой чек-лист или не выполнено условие этапа, карточка стоит.

Клиент

Имя
ТОО «Кофейня Арома»

Телефон
+7 727 *** 44 10

Откуда
Сарафан

Коммерческий объект, работаем по договору с ЭЦП.

Деньги

Сумма договора
4 200 000

Оплачено
2 100 000

Остаток
2 100 000

Подрядчикам
0

Отметить оплату

Документы

Эскиз и 3D
есть

КП
есть

Договор
подписан

Чертежи для цеха
-

Акт сдачи
-

КП и договор →

Чек-лист: Конструктор · прочее изделие · 8 из 8

Карточка проекта К-1504. Шаги этапов сверху. Кнопка «→ Запуск в производство» не пускает: менеджер не подтвердил финальный техпроект. Ниже клиент, деньги, документы, чек-лист, изделия, ТЗ по коммуникациям, модерация, история изменений.

Своя воронка, чек-лист под тип изделия и загрузка каждого по дням

КОНТРОЛЬНЫЙ ЗАМЕР • ОТРИСОВКА • СОГЛАСОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ • СПЕЦИФИКАЦИЯ • ПЕРЕДАНО

Корпус · мебель на заказ
Коммерческое предложение

Конструкторская воронка

Своя доска со своими этапами. Внутри карточки — чек-лист под тип изделия: кухня, шкаф, другое. Конструктор не вспоминает, что сделать, а идёт по пунктам; пока не отмечено всё — в производство не уйдёт.

Замер1

К-1506

Мария Ким

Кухня П-образная · фасады шпон · встроенная техника

Тимур чек-лист 2/10

Техпроект1

К-1513

Гульнара Тлеуова

Шкаф в прихожую 1,8 м

Артём чек-лист 2/9

Изменения клиента1

К-1514

Роман Ковалёв

Кухня с островом · фасады эмаль

Сауле чек-лист 4/10

Спецификация и раскрой0

—

На модерации1

К-1504

Другое изделие

ТОО «Кофейня Арома»

Барная стойка и витрины · шпон дуба · металлокаркас

Тимур чек-лист 5/8

Запущено1

К-1509

Другое изделие

ТОО «Офис-Плюс»

Ресепшн и шкафы · металлокаркас

Артём чек-лист 8/8

К-1514 · согласование изменений

Клиент поменял модель духового шкафа после договора — дополнительное согласование, как у вас: изменения → подпись клиента → дальше.

Пакет от менеджера

Конструктор получает карточку с договором, эскизом, замерами, материалами и фурнитурой — менеджер не передаст без своего чек-листа.

ВЫ СКАЗАЛИ НА ВСТРЕЧЕ

Конструкторская воронка. На карточке — прогресс чек-листа. К-1514: клиент поменял технику после договора — карточка на «согласовании изменений».

Чек-листы этапов

Шаблон, по которым ведут менеджер и конструктор. Пункты добавляете и меняете сами — новая карточка сразу получает новый список.

Менеджер → конструктор

1 Договор подписан (бумага или ЭДП)

2 Предоплата получена

3 Предварительный замер согласован с клиентом

4 Замеры перенесены замеры приехали

5 Материалы и цвета выбраны: португ., фасады, ручки

6 Фурнитура выбрана: петли, шкафы, подтяжки

7 Техника: модель и размеры (для кухни)

8 Адрес, этаж, лифт, срок монтажа

9 Особые пожелания клиента записаны

Пункт

Конструктор: кухня

1 Контрольный замер: стены, углы, коммуникации

2 Проверка технических параметров

3 Снятие мебели, вынос, демонтаж

4 Карта раскроя ЛДСП

5 Кухня по дизайну

6 Спецификация фурнитуры: петли, шкафы, подтяжки

7 Фасады: тип, цвет — подтверждение отменено

8 Стопанализ: материалы и раскрой — подтверждение отменено

9 Чертежи: сборка для цеха

10 Заявка на склад: сформирована

Пункт

Конструктор: шкаф, гардероб

1 Замер мебели: перегородки и полки

2 Системы дверей: профиль, количество петель

3 Стенки или зеркало — подтверждение отменено

4 Наполнение: вешалки, шкафы, полки

5 Карта раскроя ЛДСП

Конструктор: прочее изделие

1 Контрольный замер

2 Чертежи общего вида согласованы

3 Материал, цвет, шпон — подтверждение отменено

4 Карта раскроя ЛДСП

5 Кухня по дизайну

Чек-листы. Менеджер → конструктору; кухня; шкаф; прочее. Пункты добавляете сами.

КОРПУС

Мебель на заказ

Загрузка и отпуск

Загрузка и отпуск: октябрь

Итог: чек-лист под тип изделия: кухня, шкаф, другое. Конструктор. Отпуска — не так же как менеджер, чтобы не забыть, что делать, когда бригады нет.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Бригада 1: Сергей, Алина																															
Бригада 2: Руслан, Денис																															
Бригада 3: Виталий, Ирина																															
Тимур: менеджер																															
Сауле: конструктор																															
Артём: менеджер																															

Свободные дни

Бригада 1: свободна с 01.10 по 05.10, Бригада 2 — с 01.10 по 07.10, Бригада 3: свободна с 01.10 по 03.10

Отпуска

Виталий: 03.10-05.10, Руслан: Бригада 2: 01.10-03.10

Загрузка и отпуск. Бригады и конструкторы по дням октября, отпуска и свободные окна.

«Чтобы конструктор не придумывал и не вспоминал, что ему нужно сделать, а выполнял по пунктам». Менеджер тоже не передаст карточку без своего чек-листа: договор, предоплата, эскиз, материалы, фурнитура, техника.

Pllato · студия разработки · pllato.kz

96

Карточка размножается на доски подрядчиков — со сроком, документами и ценой

9 ПОДРЯДЧИКОВ · СВОЯ МАЛЯРКА · ДЕДЛАЙНЫ · ПРОСРОЧКИ · САЛЬДО · КАБИНЕТ С ЛОГИНОМ

Корпус · мебель на заказ
Коммерческое предложение

КОРПУС
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

СВОЕВЕННИК

Пульт

Приходы и расходы

Долги клиентов и подрядчикам

Зарплаты

Аналитика

ПРОДАЖИ

Воронка заказов

Карточка заказа

Клиенты

Расчёт заказа

КП, договор, ЭЦП

WhatsApp

КОНСТРУКТОРЫ

Конструкторская воронка

Чек-листы этапов

Загрузка и отпуска

ПРОИЗВОДСТВО

Цех и бригады

Подрядчики

заказ, клиент, артикул, ячейка

ЗАЯВКА

Собственник

+ Подрядчик

Подрядчики

У каждого подрядчика своя доска. Конструктор отметил участников и приложил документы — на доске каждого появилась карточка со сроком. Начальник производства видит, кто затягивает, ещё до того, как сорвётся монтаж.

РАБОТ В ПРОЦЕССЕ

6

у 6 подрядчиков

ПРОСРОЧЕНО

1

«Стекло-Мастер»

СДАЕТ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

3

до 11.10

ДОЛЖНЫ ПОДРЯДЧИКАМ

1,08 млн

сальдо

С ДОСТУПОМ В КАБИНЕТ

4 из 9

остальным — уведомления

«Раскрой-Центр»

3

Распил ЛДСП и кромок

К-1501

Распил ЛДСП Egger W1000 · 18 листов, кромка ПВХ 2 мм

срок 02.10

134 000

сдал

К-1503

Распил ЛДСП Куполхруп дуб сонома · 7 листов

срок 01.10

42 000

сдал

К-1509

Распил ЛДСП Egger W980 · 9 листов

срок 08.10

68 000

передано

Кабинет →

Малярка

1

Покраска фасадов МДФ · свой участок

К-1501

Покраска 14 фасадов МДФ · RAL 9010 мат

срок 09.10

168 000

в работе

Кабинет →

«МеталлФорм»

1

Металлокаркасы, опоры

К-1509

Металлокаркас ресепшн 2,8 м · порошковая покраска

срок 14.10

380 000

в работе

Кабинет →

«Stone Line»

1

Столешницы: кварц, акрил

К-1501

Столешница кварц 3,4 м + остров, вырез под мойку

срок 12.10

520 000

в работе

Кабинет →

«Стекло-Мастер»

1

Стекло, зеркала, фаяет

К-1503

Зеркало серебро 4 мм · 2 полотна 2350×780

срок 02.10

68 000

просрочка 3 дн.

Кабинет →

Подрядчики. У каждого своя доска: распил и кромка, малярка, металл, камень, стекло, алюминий. «Стекло-Мастер» просрочил зеркала по K-1503 — карточка красная, а монтаж у клиента 10 октября. Сверху — сколько работ, просрочек и сколько мы должны.

Кабинет подрядчика · «Стекло-Мастер»

«Стекло-Мастер»

Подрядчик заходит под своим логином и видит только свои заказы: что сделать, документы для скачивания, срок и напоминания. Отмечает «взял в работу» и «готово» — у вас статус меняется сам.

ЗАКАЗОВ

1

в работе

БЛИЖАЙШИЙ СРОК

02.10

есть просрочка

НАЧИСЛЕНО

68 000

₸

ОПЛАЧЕНО

34 000

₸

К ОПЛАТЕ

34 000

сверка

К-1503 · Зеркало серебро 4 мм · 2 полотна 2350×780

передано 26.09 · срок 02.10 · просрочено 3 дн.

Размеры полотен.pdf

Готово — можно забирать

Кабинет подрядчика. Свой логин: заказы от вас, файлы для скачивания, срок и «осталось N дней», кнопки «взял в работу» и «готово», сверка оплат.

«Сегодня это подрядчик, завтра мы этот этап можем у себя внедрить» — поэтому малярка в системе та же доска: контроль одинаковый.

Pllato · студия разработки · pllato.kz

07

Заявка из карточки: что взять со склада, что дозаказывать и у кого

ЯЧЕЙКИ · РЕЗЕРВ ПОД ЗАКАЗЫ · МИНИМАЛЬНЫЕ ОСТАТКИ · ПРАЙСЫ ПО АРТИКУЛУ

Корпус · мебель на заказ
Коммерческое предложение

Заявки и закупка

Конструктор после своего этапа формирует заявку на склад прямо в карточке. Когда заказ уходит в производство, закупщик видит её: что отгрузить со склада, что дозаказывать у поставщика.

К-1509 · от Артём · 04.10

новая

позиция	ячейка	нужно	свободно	решение
ЛДСП Egger W980 платиново-белый · 16 мм	A-02	9 лист	6	дозаказывать 3 лист · «Мебельные материалы KZ»
Кромка ПВХ 2×19 белая W1000	B-01	140 м	600	со склада
Петля Blum Clip Top Blumotion 110° накладная	Ф-03	24 шт	168	со склада
Ящик Blum Legrabox M 500 мм антрацит	Ф-11	6 компл	4	дозаказывать 2 компл · «Blum Казахстан»
Ножка регулируемая 100 мм + цоколь	Ф-20	16 шт	228	со склада
ХДФ белый 3 мм · задняя стенка	A-07	3 лист	27	со склада

Дозаказывать недостающее

Отгружено в цех

К-1501 · от Тимур · 29.09

отгружено

позиция	ячейка	нужно	свободно	решение
ЛДСП Egger W1000 ST9 белый премиум · 2800×2070×16	A-01	18 лист	33	выдано

Заявки и закупка. Конструктор сформировал заявку по К-1509: ЛДСП W980 — нужно 9 листов, свободно 6 → дозаказывать 3 у «Мебельные материалы KZ»; Legrabox — дозаказывать 2; кромка и петли — со склада. «Отгружено в цех» списывает остатки с ячеек.

Остатки и ячейки

Инвентаризация

Склад при производстве, около 60 м², у каждой позиции — номер ячейки. «Свободно» = остаток минус резерв под заказы. Ниже минимума — подсветка и задача закупщику.

Листовые

ячейка	позиция	артикул	остаток	резерв	свободно	мин.	цена
A-01	ЛДСП Egger W1000 ST9 белый премиум · 2800×2070×16	EG-W1000-16	24 лист	9	15	10	24 800
A-02	ЛДСП Egger W980 платиново-белый · 16 мм	EG-W980-16	6 лист	9	-3	8	23 900
A-03	ЛДСП Kronospan дуб сонома · 16 мм	KR-K016-16	14 лист	—	14	6	17 600
A-05	МДФ 19 мм под покраску · 2800×2070	MDF-19	11 лист	4	7	6	21 500
A-07	ХДФ белый 3 мм · задняя стенка	HDF-3W	30 лист	6	24	10	4 900

Остатки и ячейки. Листовые, кромка, фурнитура: ячейка, артикул, остаток, резерв, свободно, минимум, цена.

«Со склада в каждую карточку подтягиваются листовые, кромочные материалы, фурнитура... Конструктор формирует заявку на склад, а когда перешло в производство — закупщик отгружает или дозаказывает».

Бригады, готовое на складе, рейсы водителя и монтаж корпуса и фасадов

3 бригады · ждёт монтажа · материалы от подрядчиков → цех · готовое → клиенту

Корпус · мебель на заказ
Коммерческое предложение

Цех и бригады

Детали от подрядчиков и со склада пришли — бригады собирают. Готовые ждут монтажа на складе готовой продукции. Сейчас, кто собирает, тот и едет на монтаж, если появятся отдельные монтажные — это просто ещё одна роль.

Бригада 1

Сергей, Алексей

К-1501 · Кухня

Жанер Сейтбаев · монтаж 16.10

69 %

У подрядчиков

Бригада 2

Рустам, Дирдин

К-1502 · Кухня

Александр Тар · монтаж 08.10

72 %

Сборка в цеху

Бригада 3

Виктор, Курбан

К-1503 · Шкаф / гардероб

Дмитрий Аметов · монтаж 20.10

60 %

Материалы от подрядчиков

К-1509 · Другое изделие

1000 «Stone Line» · монтаж 23.10

45 %

Запуск склада и подрядчики

К-1510 · Шкаф / гардероб

Камилла Есенова · монтаж 08.10

85 %

Готово · ждёт монтажа

К-1505 · Шкаф / гардероб

Ербол Нурмаев · монтаж 05.10

Готово · ждёт монтажа на складе

Сборка в цеху

К-1502 · Кухня привез 2,8 м · ЛДСП Едге · панели Wip

Бригада 2 · ждёт детали на месте

Собрать → ждёт монтажа

Готово · ждёт монтажа на складе

К-1510 · Камилла Есенова

материалы · 02 · 14 материалов · монтаж 08.10

Монтаж — по шагам

1

Доставка

из цеха в клиенту

2

Монтаж корпуса

Бригада

3

Монтаж фасадов

после столешницы и техники

4

Сдача

акт, фото, остаток оплаты

Цех и бригады. Что у какой бригады, сборка, готовое на складе ждёт монтажа.

Доставка и монтаж

Для клиентов: материалы и детали от подрядчиков — в ван и цех, готовая мебель — к клиенту. Монтаж делится на корпус и фасады. Водитель, даже сторонний, ждёт только своих рейсов.

05.10 · пн · сегодня

14.00 · Монтаж фасадов гардеробной · К-1505

17 · из цеха, день 10

Монтаж 3

06.10 · вт

09.00 · Забрать детали фасада · К-1509

«Раскрой-Центр», ул. Бейшеналиева 10 · 7 цех

12.00 · Забрать профиль кухни · К-1503

«Объедини ул. Саувабаева 2 · цех

08.10 · чт

09.00 · Доставка профиль клиенту · К-1510

ул. ул. Габдуллина 63

10.00 · Монтаж корпуса и фасадов · К-1510

ул. Габдуллина 63

09.10 · пт

09.00 · Доставка кухни · К-1502

ул. ул. Саувабаева 2 · цех

10.00 · Монтаж кухни · К-1502

мкр. Саувабаева 2, 18

Доставка и монтаж. По дням: рейсы за деталями к подрядчикам и к клиенту, монтаж корпуса и фасадов.

Мои заказы · Бригада 1

С телефона. Сборщик видит только свои заказы — не все заказы компании.

К-1501 · Кухня

Жанер Сейтбаев, на 112

Этап

Производство и подрядчики

Монтаж

16.10

готово

«Раскрой-Центр»

срок 09.10

Малерка

срок 12.10

«Stone Line»

Чертежи сборки

Смонтировано — фото

К-1509 · Другое изделие

Вад «Старый Тау», 4Б, 7 этаж

Этап

Запуск в производство

Монтаж

23.10

срок 14.10

«МеталлФорм»

срок 08.10

«Раскрой-Центр»

Чертежи сборки

Смонтировано — фото

Бригада с телефона. Только свои заказы: этап, монтаж, что готово у подрядчиков, чертежи, фото монтажа.

Мои рейсы · Жандос

Водитель видит только свои рейсы: когда, откуда, куда и что везти. Новый рейс — уведомление на телефон.

Рейсы

5 на день сегодня

06.10 09.00 · К-1509-Раскрой-Центр, ул. Бейшеналиева 10 → цех

Забрать

06.10 12.00 · К-1503-«Объедини», ул. Суванбаева 2 → цех

Забрать

08.10 09.00 · К-1510-ул. Габдуллина, 63

Доставка

09.10 09.00 · К-1502-ул. мкр. Саувабаева 2, 18

Доставка

12.10 11.00 · К-1501-Stone Line» → цех

Забрать

Забрал груз

Водитель. Даже сторонний: только свои рейсы, уведомление о новом.

«Есть стадия, когда изделия зависли на складе — ждём монтаж; монтаж корпуса отдельно, фасады отдельно». Готовый заказ сам уведомляет менеджера: «сообщите клиенту, договоритесь о монтаже».

Pllato · студия разработки · pllato.kz

69

Ваша таблица расчёта — внутри системы; КП и договор собираются сами

ПУНКТЫ И ВАРИАНТЫ · ПРАЙСЫ ПОСТАВЩИКОВ · КП · ДОГОВОР · ЭЦП ИЛИ БУМАГА

Корпус · мебель на заказ
Коммерческое предложение

КОРПУС

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

Собственник

Пульт

Приходы и расходы

Долги клиентов и подрядчикам

Зарплаты

Аналитика

Продажи

Воронка заказов

Карточка заказа

Клиенты

Расчёт заказа

КП, договор, ЭЦП

WhatsApp

Конструкторы

Конструкторская воронка

Чек-листы этапов

Загрузка и отпуски

Производство

Цех и бригады

Расчёт заказа

Ваша Google-таблица внутри системы: менеджер проходит пункты, в каждом — свои варианты, цены подтягиваются из прайсов поставщиков по артикулу. Здесь 15 пунктов для примера — в вашей таблице около 50 пунктов и 200 вариантов, переносим все.

Изделие

Кухня

Кромка

Кромка ПВХ 2×19 белая W1000

Фасады

МДФ эмаль, своя малярка

Длина, м

3

Ящики

Ящик Blum Legrabox M 500 мм антрацит

Ножки

16

Подсветка, м

3

ЛДСП корпуса

ЛДСП Egger W1000 ST9 белый премиум · 2800×20

Метров

300

Площадь фасадов, м²

5,2

Петли

Петля Blum Clip Top Blumotion 110° накладная

Ящиков

5

Навесы, пар

8

Наценка, %

35

Листов

10

Задняя стенка ХДФ, листов

3

Столешница

Кварц «Stone Line»

Петель, шт

20

Подъёмники Aventos

2

Gola, шт

3

Итог

Материалы и подрядчики

1 332 780

Сборка и монтаж · 12 %

159 934

Себестоимость

1 492 714

Наценка 35 %

522 286

Цена клиенту

2 015 000

Прайсы обновлены 03.10: «Blum Казахстан», «Мебельные материалы KZ», «ДСП-Центр». Если у поставщика цена изменилась — расчёт пересчитается.

ПУНКТ	ВЫБРАНО	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
Кухня	ЛДСП Egger W1000 ST9 белый премиум · 2800×2070×16	10 листов	34 800	348 000

Расчёт заказа. Корпус, кромка, задняя стенка, фасады (МДФ эмаль своей малярки, шпон, алюминий), столешница, петли, ящики, подъёмники, ножки, навесы, Gola, подсветка, наценка — цена клиенту и себестоимость сразу. В демо 15 пунктов; в вашей таблице около 50 и 200 вариантов — переносим все, в полном пакете.

КП, договор, ЭЦП

КП собирается из расчёта, договор — из карточки: клиент, изделие, сумма, сроки, график оплат. Подписать можно на бумаге (скан в карточку) или по ссылке через ЭЦП.

КП · K-1508 · Ольга Ли

КОРПУСМЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ · АЛМАТЫ

КП № K-1508
05.10.2026

Коммерческое предложение

Кухня 3 м · ЛДСП + стекло · ЖК «Nurlu Tau», кв. 9

КорпусЛДСП Egger W1000 ST9 белый премиум

10 лист

КромкаКромка ПВХ 2×19 белая W1000

300 м

ЗадняяХДФ белый 3 мм стенка

3 лист

ФасадыМДФ эмаль, своя малярка

5,2 м²

Договор · K-1507 · Асет Байжанов

✓ Договор сформирован из карточки

✓ Отправлен клиенту ссылкой · 03.10

... Подпись клиента через ЭЦП (eGov / NCALayer)

... Подпись со стороны компании

... Счёт на предоплату 50 %

Клиент подписал ЭЦП

Бумажный — загрузить скан

КП, договор, ЭЦП. КП из расчёта — в WhatsApp клиенту. Договор из карточки — подпись ЭЦП по ссылке или скан бумажного.

«Расчёт очень сложный — как отдельная программа». Поэтому два пакета: калькулятор сразу внутри системы (2,5 млн) или пока в вашей таблице, а в карточку — сумма (2,2 млн).

Pllato · студия разработки · pllato.kz

10

Переписка с клиентом — в карточке. Долги, расходы и подрядчики — без таблиц

WHATSAPP В КАРТОЧКЕ · АВТО-СООБЩЕНИЯ · ДОЛГИ · САЛЬДО ПОДРЯДЧИКОВ · АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

Корпус · мебель на заказ
Коммерческое предложение

WhatsApp в карточке заказа

Номер компании подключается к системе: вся переписка менеджеров с клиентами видна в карточке заказа, руководитель видит, кто и когда ответил. Казахстанский провайдер — около 5 000 Т за номер в месяц.

Чаты

Жанар Сейтова · K-1501
Отлично, спасибо!
ждёт ответа

Динара Ахметова · K-1503
Есть новости по зеркалам?
ждёт ответа 5 ч

Камила Есенова · K-1510
Да, ждём
ждёт ответа

Жанар Сейтова · K-1501 · менеджер Айгерим

09:13
Добрый день! Когда будут фасады? Мы переезжаем 20-го

09:28 · Айгерим
Здравствуйте, Жанар! Фасады в покраске до 9 октября, монтаж стоит на 16-е — успеваем.

09:21
Отлично, спасибо!

Добрый день! Заказ на этапе «У подрядчиков».

Отправить

WhatsApp. Номер компании подключён к системе: чаты по заказам, «ждёт ответа 5 ч», авто-сообщения клиенту на этапах договора, запуска, готовности и монтажа. Казахстанский провайдер — около 5 000 Т за номер в месяц.

Приходы и расходы · октябрь

Отслеживайте и подтягивайте подорожные расходы из картонных заказов клиентов. Административные расходы — чай, кофе, вода, уборка, кондиционер, техника, аренда — выносятся одной строкой и тем же видом.

Расходы по статьям

Аренда	1 550 000
Подрядчики	428 000
Материалы	480 000
Административные	218 000
Подписки	100 000

Подписки, которые уйдут

Битрикс24 и WhatsApp	380 000 Т в месяц
За год	4 560 000 Т
Срок системы сервиса	до 10 000 Т в месяц
WhatsApp, казахстанский провайдер	≈ 5 000 Т за номер

Мы скажем им: ВЕЩАЙТЕ! Ибо на дороге и на Мобиле скучать скучай! Иначе клиенты обвинят вас в том, что вы не любите их и не любите их клиентов.

дата	статья	что	приток	расход
03.10	Подарки	«Стекло Мастер» - заказ K-1503		34 000
05.10	Административные	Принтер для конструктора		89 000
04.10	Зачисл	Предоплата K-1513 - Топуева	320 000	
04.10	Подарки	Битрикс24 и WhatsApp - подписки		100 000
04.10	Административные	Расчет кондиционера в шоу		45 000
03.10	Административные	Уборка офиса и кафе - месяц		60 000
03.10	Административные	Вода, чай, кофе		24 000
03.10	Подарки	«Stone Line» - заказ K-1501		200 000
02.10	Материалы	«Ваш Казахстан» - бухгалтер		400 000

Приходы и расходы. По статьям, включая административные: вода, кофе, уборка, кондиционер, принтер.

Долги клиентов и подрядчикам

Слева — список клиентов со своим долгом или оплатой аванса. Справа — список на долгие подрядчики, цена фиксируется, когда конструктор передаст работу, оплата вычитается.

Клиенты - 11 310 000 Т

ФИО	заказ	статус	долг
Нурлан Саржанов	K-1483	Сделано	200 000
Камелия Есенбаева	K-1510	Отлично - ждём монтажа	400 000
Алексей Пав	K-1502	Сделано и оплачено	825 000
Жанар Сейтова	K-1501	У подрядчиков	1 740 000
Динара Ахметова	K-1503	У подрядчиков	445 000
ТОО «Офис Плюс»	K-1509	Заказ: оплата и подрядчики	1 150 000
ТОО «Юрфакс Арена»	K-1504	Конструкторская документация	2 100 000
Гульмира Турсунова	K-1513	Конструкторская документация	320 000
Роман Ковалев	K-1514	Конструкторская документация	1 575 000
Мария Ким	K-1506	Инструментальный заказ	2 415 000

Курсовая оплата — заказ сделан, остаток не оплачен.

Подрядчики - 1 077 000 Т

подрядчик	калькуляция	сделано	долг
«Резерв Центр» Разработка и монтаж	300 000	380 000	0
Материалы Поставка фасадов КД	160 000	0	160 000
«МеталлФорм» Монтаж фасадов, установка	380 000	0	380 000
«Stone Line» Составление 3D-модели, монтаж	830 000	570 000	260 000
«Стекло Мастер» Стекло, монтаж, фарт	60 000	34 000	26 000
«Айсберг» Алюминиевый фасад и профильный	355 000	120 000	235 000

Мы скажем им: ВЕЩАЙТЕ!
«Ваш Казахстан» бухгалтерский учет — это просто удобно, потому что мы работаем вместе, поэтому нам не нужно платить, потому что мы все делаем.

Долги. Клиенты — остатки по этапам; подрядчики — начислено, оплачено, сальдо.

Pllato · студия разработки · pllato.kz

11

Изделия, коммуникации, модерация и пакет запуска — внутри карточки

Изделия проекта · 3

1 проект → много изделий → у каждого свои производственные и подрядные задачи.

Каркас · металл

металл

Облицовка · шпон дуба

шпон

Столешница · камень

камень

ТЗ по коммуникациям · 6 из 6

✓ Электрика — розетки, выводы, мощность, высоты

✓ Вода — точки подключения, высоты

✓ Канализация — точка, диаметр, уклон

✓ Вентиляция — канал, размеры, ограничения

✓ Газ — точка подключения, ограничения

✓ Техника — посудомойка, духовой шкаф, холодильник, вытяжка

ТЗ строителям · PDF

Модерация техпроекта менеджером · есть замечания

03.10 · Ольга

Высота барной стойки 1100 вместо 1050 — по Т

04.10 · Ольга

Добавить розетку USB

Замечания → вернуть конструктору

Финальная модерация

Пока менеджер не подтвердил финальный технический проект, запуск производства невозможен. Все замечания сохраняются в истории.

Изделия и модерация. У каждого изделия свои задачи цеха и подрядчиков. ТЗ по коммуникациям — электрика, вода, канализация, вентиляция, газ, техника — уходит строителям PDF. Замечания менеджера возвращают проект конструктору и сохраняются в истории; без финальной модерации запуск невозможен.

Пакет запуска в производство · 6 из 8

✓ Общий вид

ОБЯЗАТЕЛЕН

✓ Вид для монтажа

✓ Сборочные чертежи

ОБЯЗАТЕЛЕН

✓ Подрядные таблицы

✓ Подрядные чертежи

ОБЯЗАТЕЛЕН

✓ Закупочная заявка

☐ Спецификация

ОБЯЗАТЕЛЕН

☐ Все необходимые фай

Пакет запуска. Общий вид, вид для монтажа, сборочные и подрядные чертежи, подрядные таблицы, закупочная заявка, спецификация, файлы — пока не собрано всё, проект в производство не уходит.

Календарь начальника производства и снабжение с датами поставки

ВСЕ ДЕДЛАЙНЫ В ОДНОМ КАЛЕНДАРЕ · ПРОСРОЧКИ ВЫДЕЛЕНЫ · В НАЛИЧИИ / НА ЗАКАЗ

Корпус · мебель на заказ
Коммерческое предложение

КОРПУС

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

СВОБЕДИНИК

Пульт

Приходы и расходы

Долги клиентов и подрядчикам

Зарплаты

Аналитика

Отчёты руководителя

ПРОДАЖИ

Воронка заказов

Карточка заказа

Клиенты

Расчёт заказа

КП, договор, ЭЦП

Календарь дедлайнов

заказ, клиент, артикул, ячейка

ЗАЯВКА

Собственник

КАЛЕНДАРЬ НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВА

Все производственные, подрядные и снабженческие дедлайны — в одном календаре. Просроченное выделяется само и не теряется внутри карточек.

РАБОТ В КАЛЕНДАРЕ
16
цех, подрядчики, поставки

ПРОСРОЧЕНО
1
уведомлены исполнитель и руководитель

ДЕДЛАЙН ЗАВТРА
1
исполнитель + руководитель

ЧЕРЕЗ 2 РАБОЧИХ ДНЕЙ
1
напоминание исполнителю

ПРОЕКТ	РАБОТА	ИСПОЛНИТЕЛЬ	НАЧАЛО	ДЕДЛАЙН	СТАТУС
K-1493 · Нурлан Сарсенов	Столешницы: кварц, акрил	«Stone Line»	05.09	18.09	Получено
K-1510 · Камила Есенова	Распил ЛДСП и кромок	«Раскрой-Центр»	19.09	23.09	Получено
K-1505 · Ербол Нурланов	Алюминиевые фасады и профиль купе	«AluSystem»	12.09	24.09	Получено
K-1502 · Алексей Пак	Распил ЛДСП и кромок	«Раскрой-Центр»	22.09	26.09	Получено
K-1503 · Динара Ахметова	Распил ЛДСП и кромок	«Раскрой-Центр»	26.09	01.10	Получено
K-1501 · Жанар Сейтова	Распил ЛДСП и кромок	«Раскрой-Центр»	29.09	02.10	Получено

Календарь дедлайнов. Цех, подрядчики и поставки по всем проектам. Просроченное подсвечено, о дедлайне через 2 дня, завтра и о просрочке узнают исполнитель и руководитель.

Снабжение: в наличии и на заказ

Позиция

Каждая позиция связана с проектом и изделием. Для заказных позиций плановая дата поставки — обязательное поле, без неё позиция не сохраняется. Если поставка влияет на дату монтажа — она видна начальнику производства и в карточке сборщика.

ПРОЕКТ	ПОЗИЦИЯ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО	ТИП	ПОСТАВЩИК	ЗАКАЗ	ПЛАН ПОСТАВКИ	ФАКТ	ОТВЕТСТВ.
K-1509	ЛДСП Egger W980 · 16 мм	EG-W980-16	9 листов	в наличии	склад, ячейка А-02	05.10	—	05.10	Ерлан
K-1509	ЛДСП Egger W980 · 16 мм (недостача)	EG-W980-16	3 листа	на заказ	«Мебельные материалы KZ»	05.10	08.10	—	Ерлан
K-1501	Ящик Blum Legrabox M 500 антрацит влияет на дату монтажа	770M5002S	2 компл	на заказ	«Blum Казахстан»	02.10	09.10	—	Ерлан
K-1503	Профиль купе, направляющие влияет на дату монтажа	ALU-K2	1 компл	на заказ	«AluSystem»	29.09	03.10	просрочено	Ерлан
K-1502	Петля Blum Clip Top Blumotion	71B3550	24 шт	в наличии	склад, ячейка Ф-03	26.09	—	26.09	Ерлан

Снабжение. Позиция привязана к проекту; для заказной — плановая дата поставки обязательна. Если поставка влияет на монтаж — видно начальнику производства, менеджеру и сборщику.

Pllato · студия разработки · pllato.kz

13

Оплата и закрытие, причины отказа, автоматизации

ОСТАТОК СЧИТАЕТСЯ САМ · АВР → ОПЛАТА → ЗАКРЫТ · 8 ПРИЧИН ОТКАЗА · 14 АВТОМАТИЗАЦИЙ

Корпус · мебель на заказ
Коммерческое предложение

Оплата и закрытие

По каждому проекту: сумма договора, оплачено, остаток (считается сам), даты платежей, статус оплаты и закрывающие документы. АВР подписан → проект в оплате; оплачено и документы закрыты → проект закрыт.

ДОГОВОРОВ	ОПЛАЧЕНО	ОСТАТОК	ЖДУТ ЗАКРЫТИЯ
13	15,45 млн	12,43 млн	1
на 27,88 млн	фактически	к получению	в статусе «Оплата»

ПРОЕКТ	КЛИЕНТ	ЭТАП	ДОГОВОР	ОПЛАЧЕНО	ОСТАТОК	СТАТУС ОПЛАТЫ	АВР	ДОКУМЕНТЫ
K-1501	Жанар Сейтова	Производство и подрядчики	3 480 000	1 740 000	1 740 000	Частично	—	—
K-1502	Алексей Пак	Сборка	1 650 000	825 000	825 000	Частично	—	—
K-1503	Динара Ахметова	Производство и подрядчики	890 000	445 000	445 000	Частично	—	—

Оплата и закрытие. Договор, оплачено, остаток, статус «Ожидается / Частично / Оплачено», АВР и закрывающие документы. Для бухгалтерии — отдельная роль «Финансы».

Причины отказа

Если заявка слетает до договора, система требует выбрать причину из списка. Свободный комментарий — дополнительно, но не вместо причины; для «Другое» он обязателен.

Причины · сентябрь – октябрь	Последние отказы
Цена 10	Гульмира С. · Кухня 3,4 м 02.10 · Ошибка · Выбрала предложенные диваны на 380 тыс.
Конкурент 5	ТОО «Арма» Девелопмент · Шкафы в 12 квартир 20.09 · Авария · Нужно за 14 дней
Срок 6	Олжас К. · Гардеробная 27.09 · Мансэт · 3 попытки за 5 дней
Изменились планы 4	Елена П. · Кухня с островом 24.09 · Дина · Ошибка (уменьш до весны)
Нет бюджета 3	Марат Б. · Кухня 2,4 м 22.09 · Ошибка
Не можем изготовить 2	Сабина Т. · Детская 20.09 · Мансэт
Не выводит на связь 7	Кафе «Тибетейка» · Барная стойка из камня 18.09 · Авария · Гнутый камень — не берет ни один подрядчик
Другое 1	

Т3 · РАЗДЕЛ 4.1 · Обязательная классифицированная причина отказа: цена, конкурент, срок, изменились планы, нет бюджета, не можем изготовить, не выводит на связь, другое (с

Причины отказа. Без причины заявку не закрыть; «Другое» — только с комментарием.

Автоматизации и уведомления

Все 14 автоматизаций, действие от вешки Т3 и правила уведомлений: в проблемном и проблемном режиме работ не только исполняются, но и уведомляются процессы.

Событие → действие	автоматическое действие	вкл.
1 Создать новую заявку	Назначить ответственного менеджера	☑
2 Детально утвердить	Показать в личном кабинете менеджера	☑
3 Заявка закрыта как отказ	Требовать причину отказа	☑
4 Передача конструктору	Зафиксировать дату, создать задачу конструктору	☑
5 Направление с замечаниями	Вернуть проект конструктору, сохранить замечания	☑
6 Финальная проверка	Разрешить доступ производству	☑
7 Запуск в производство	Создать связанные производственные и подзадачи (срок/направление)	☑
8 Создать связанную заявку	Требовать плановую дату поставки	☑
9 Поставка произведена	Предупреждение о срыве и начале нового производства	☑
10 Назначение сборки	Создать карту/сборку в личном кабинете	☑
11 Готово к выводу	Предупредить дату доставки	☑
12 Итоги проверки	Задача контроля качества в АВР	☑
13 АВР подписан	Перевести проект в оплату	☑
14 Оплата и документы закрыты	Перевести проект в «Закрыт»	☑

Уведомления и просрочки

Автоматизации. Все 14 из Т3: событие → действие, плюс правила уведомлений.

Отчёты руководителя и ответы на ваши вопросы до разработки

ПОЧЕМУ ЗАКАЗ СТОИТ · КТО ОТВЕЧАЕТ · ЧТО БЛОКИРУЕТ · 10 ВОПРОСОВ — НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Корпус · мебель на заказ
Коммерческое предложение

Отчёты руководителя

Восемь отчётов из вашего ТЗ. Главная идея — видно не только этап заказа, но и почему он на этом этапе, кто отвечает за следующий шаг, какой дедлайн и что блокирует движение.

Продажи 38 заявок · конверсия в договор 34 % · 21,6 млн · главная причина отказа — цена	Проекты 15 активных проектов и их текущие этапы
Просрочки 2 просрочки: «Стекло-Мастер» (Максат), поставка профиля (Ерлан)	Производство загрузка бригад 72 %, сроки по цеху
Подрядчики 6 работ в процессе, 81 % в срок	Снабжение 3 заказные позиции, 1 просрочена

Отчёты. Продажи, проекты, просрочки, производство, подрядчики, снабжение, монтаж, финансы — и таблица «почему заказ стоит»: что блокирует и кто делает следующий шаг.

Вопросы до разработки · наши предложения

Раздел 21 вашего ТЗ. На каждый вопрос — как мы предлагаем сделать; финально утверждаем вместе на старте.

1. Какие роли и права доступа? Предлагаем 9 ролей демо: собственник, менеджер, конструктор, начальник производства, снабжение, сборщик, водитель, подрядчик, финансы; права «смотреть / менять» по матрице раздела 13.
2. Какие статусы и причины отказа утвердить? Этапы и 8 причин — как в вашем ТЗ, уже в демо. Правим на шрифтке без доплаты.
3. Какие документы генерируются, какие прикрепляются? Генерируем: КП, договор, ТЗ строителям, заявку на склад АВР. Прикрепляем: эскизы, замеры, чертежи, подрядные таблицы.
4. Дедлайны — таблица или календарные дни?

Вопросы до разработки. На каждый вопрос раздела 21 — наше предложение; утверждаем вместе на старте, за 10 % предоплаты.

Каждый по своему логину — смотрит или меняет только своё

9 РОЛЕЙ · ПРАВА «СМОТРЕТЬ / МЕНЯТЬ» · ИСТОЧНИКИ · КОНВЕРСИЯ · СРОКИ · ПОДРЯДЧИКИ В СРОК

Корпус · мебель на заказ
Коммерческое
предложение

Роли и права


Каждый заходит под своим логином и сразу попадает в свою часть — выбирать роль не нужно, это только для показа. Права двух уровней: смотреть или менять. Собственник может всё и сам раздаёт права.

РАЗДЕЛ	ВС Собственник	АГ Менеджер	ТИ Конструктор	ОЛ Начальник производства	ЕР Склад и закупка	ЖА Финансы	Б1 Сборщик	ЖД Водитель	СН Подрядчик
Воронка и карточки заказов	●	●	○	○	—	—	—	—	—
Чек-лист менеджера	●	●	○	—	—	—	—	—	—
Чек-лист конструктора, подрядчики	●	—	●	○	—	—	—	—	—
Расчёт, КП, договор	●	●	○	—	—	—	—	—	—
WhatsApp с клиентами	○	●	—	—	—	—	—	—	—
Подрядчики и сроки	●	—	○	●	—	—	—	—	○
Склад и закупка	●	—	—	○	●	—	—	—	—

Роли и права. Собственник, менеджер, конструктор, начальник производства, склад и закупка, финансы, сборщик, водитель, подрядчик — по матрице видимости раздела 13 ТЗ.
● — меняет, ○ — только смотрит.

Аналитика

Сколько заказов и на какую сумму, откуда клиенты, сколько дней от договора до монтажа, кто из подрядчиков срывает сроки.

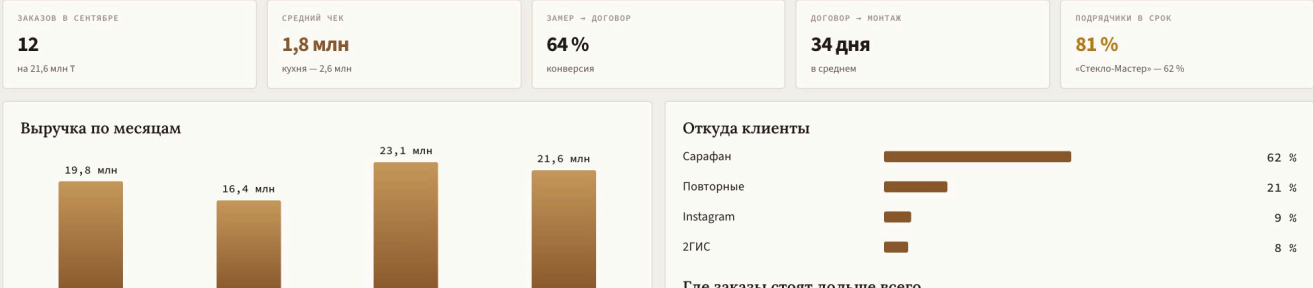

Аналитика. Выручка по месяцам, средний чек, конверсия замер → договор, дней от договора до монтажа, где заказы стоят дольше всего, кто из подрядчиков срывает сроки.

«Человек заходит под своим логином и паролем и сразу попадает в свою систему». В демо роль выбирается для показа; в рабочей системе — свой логин.

ТЗ получено → цена зафиксирована → ядро за 2–3 недели → шлифовка

10 % НА СТАРТЕ · 45 % ПОСЛЕ ЯДРА · 45 % ПОСЛЕ ШЛИФОВКИ · 4–8 НЕДЕЛЬ

Корпус · мебель на заказ
Коммерческое
предложение

- **Сейчас · ТЗ v1.0 разложено по демо**
Все 21 раздел вашего ТЗ показаны на экранах демо. Цена фиксирована — 2 200 000 ₸, калькулятор входит подарком. Осталось согласовать ответы на вопросы раздела 21.
- **Старт · 10 %**
Первичка: таблицы, выгрузка из Битрикса и МоегоСклада, шаблоны КП и договора, список подрядчиков и ТМЦ, роли сотрудников.
- **2–3 недели · ядро · 45 % после приёмки**
MVP P0 из раздела 18: воронки продаж и конструктора, карточка с изделиями и историей, чек-листы, модерация и пакет запуска, подрядчики и календарь, снабжение с датами, роли и матрица видимости. Вы проверяете и принимаете.
- **4–8 недель · шлифовка и сдача · 45 % после приёмки**
КП и договор с ЭЦП, WhatsApp, загрузка и отпуска, монтаж и рейсы, кабинет подрядчика, оплата и закрытие, автоматизации и уведомления, 8 отчётов, деньги и зарплаты, калькулятор — подарком. Вы работаете в системе, мы дорабатываем по замечаниям.

Переезд

Клиенты и история — из Битрикса, остатки и номенклатура — из МоегоСклада, справочники — из ваших таблиц. Неделю работаете параллельно, потом подписки отключаете.

Будущее — уже в каркасе

Штатный водитель, отдельные монтажники, свои участки вместо подрядчиков — это новые роли и доски, а не переделка.

Своя система один раз — без абонентской платы и ежегодного повышения тарифов

одна цена · калькулятор в подарок · 10 · 45 · 45 · код и данные — ваши · 3 месяца сопровождения

Корпус · мебель на заказ
Коммерческое предложение

что	старт 10 %	ядро 45 %	сдача 45 %	итого
Система целиком по вашему ТЗ все 21 раздел: воронки, модерация, производство и подрядчики, снабжение, монтаж, оплата и закрытие, роли, автоматизации, отчёты	220 000	990 000	990 000	2 200 000 ₸
Подарок от нас · калькулятор ваш расчёт (≈50 пунктов, 200 вариантов) внутри системы с прайсами поставщиков по артикулу	—	—	—	300 000 ₸ 0 ₸

сейчас · битрикс + мойсклад + таблицы Подписки — более 100 000 ₸ в месяц и дорожают каждый год Производство, подрядчики и склад — в отдельных таблицах Чек-листов, кабинета подрядчика и загрузки бригад нет	корпус Один платёж; потом сервер до 10 000 ₸ и WhatsApp ≈ 5 000 ₸ в месяц Все этапы, подрядчики, склад и деньги — в одной карточке Код и данные ваши; доработки потом — около 20 \$ в час
--	---

Входит

- ✓ Всё, что в демо и в вашем ТЗ: 33 экрана, 9 ролей, работа с телефона
- ✓ Калькулятор с прайсами поставщиков — подарок
- ✓ Переезд из Битрикса, МоегоСклада и таблиц
- ✓ Доработки по ходу шлифовки, обучение команды
- ✓ 3 месяца сопровождения после сдачи

Оплачиваете отдельно

- Сервер — до 10 000 ₸ в месяц, напрямую
- WhatsApp-провайдер — около 5 000 ₸ за номер
- Интеграции — только с сервисами, у которых есть API

следующий шаг

Утверждаем ответы на вопросы ТЗ → 10 % → ядро через 2–3 недели

Демо открыто: зайдите собственником, менеджером, конструктором, начальником производства, кладовщиком, финансами, сборщиком, водителем и подрядчиком. Экран «Соответствие ТЗ» ведёт по всем 21 разделу.

Pllato · студия разработки программного обеспечения · pllato.kz · демо: pllato.kz/app/mebel-vasiliy.html · предложение действительно до 31 октября 2026.
